

# バンドRF電子銃の水冷管ロウ 付け準備


磯山悟朗

# ロウ付け準備

- KEKで共振周波数とフィールドバランス調整
- 端板の変形 → 冷却水配管はめ合いに影響の恐れ
- 大和製作所ではめ合い確認 → 全て不適




- 3次元計測機を用いて冷却管接続部を変形調整
- 11月11日完了： 問題あり

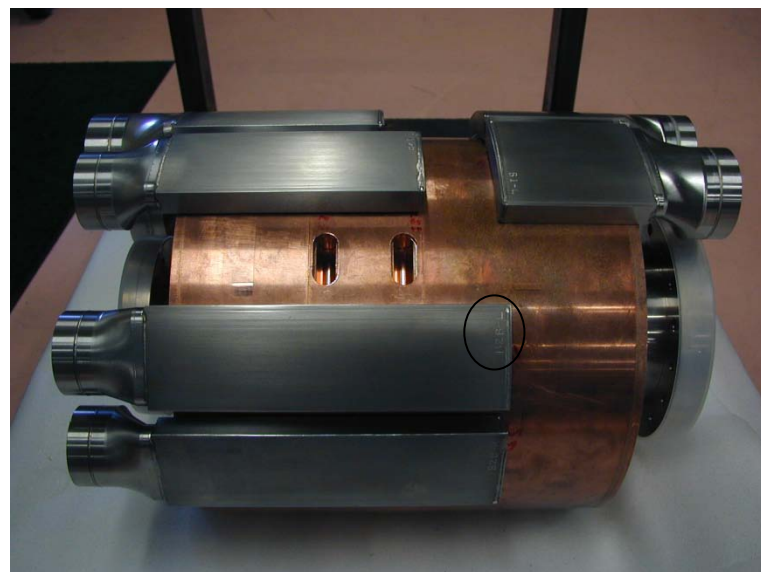


- 冷却管、B2IRとB2BLが干渉して取り付け出来ません
- 対応策として、冷却管B2IRを再製作致します。

現状

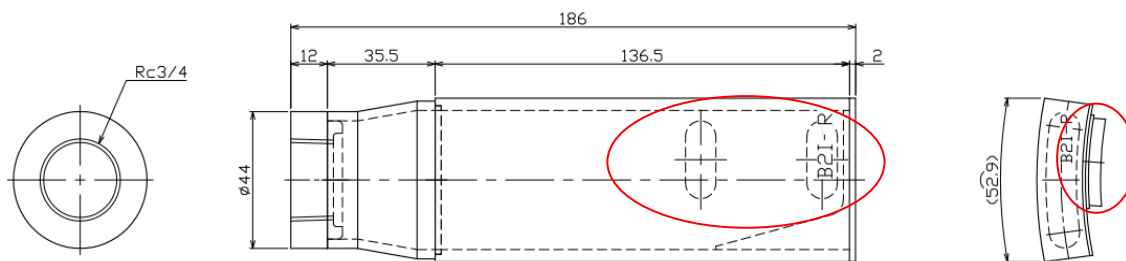

変更

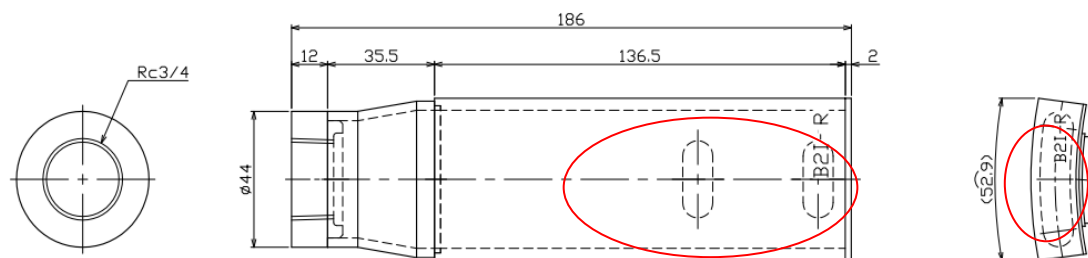

加工、溶接、Niメッキ  
3週間
